全屋空间与设备点位

2 栋 03 户型 / HA 基础数据草稿 v0.33 / 2026-11-08

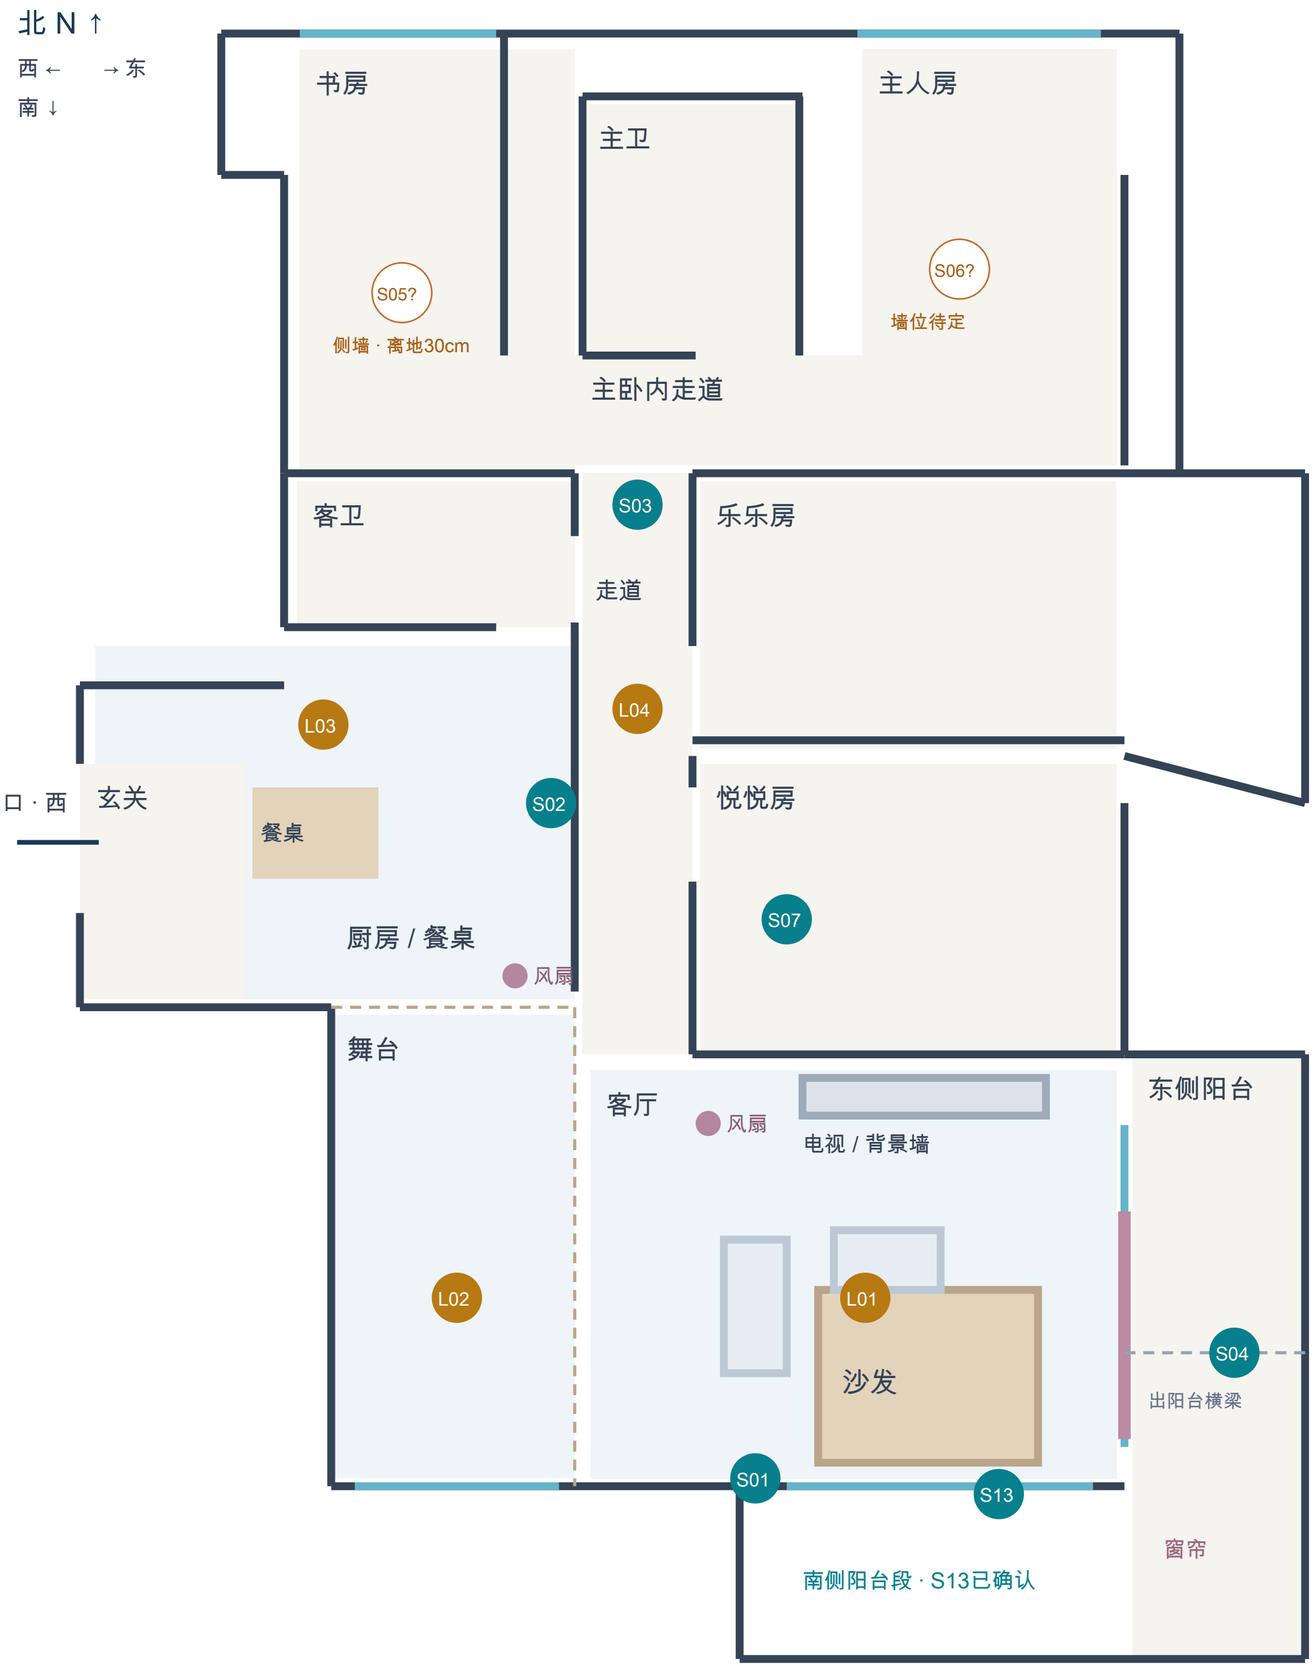

示意重绘：门洞、家具与点位非测绘精度；以尺寸原图为准。

图例与核对状态

- S 感应点：原图 / 照片定位，坐标近似
- L 灯具 / 灯组：照片投影，坐标近似

空心 S? = 仅知房间，不代表安装点。

实体取自本地导出；尚未核对生产 HA 注册表。

已落图感应点

S01 客厅领普 · 南侧沙发墙

S02 厨房领普 · 东侧操作台附近

S03 走道感应 · 单杠上方顶面

S04 阳台感应 · 出阳台横梁 / 约2.6m（单位推断）

S05 书房感应 · 梳妆台侧墙 / 离地30cm（确认）

S06 主人房感应 · 空调下方墙 / 离地30cm（确认）

S07 悦悦房感应 · 书桌上（用户确认）

S13 墙面感应 · 南侧阳台段北墙（用户确认）

已落图灯具 / 灯组

L01 客厅主灯

L02 舞台灯

L03 厨房顶灯组

L04 走道筒灯组

已登记、待定位

S08 厨房天花感应（已确认）· S09 主卫感应

S10 客卫感应 · S11 玄关 PIR

S12 LD2410 · 电视柜中间插座（用户确认；朝向未定）· D01入户门磁

L07-L14 其他照明回路 / 区域占位

卧室、卫生间、阳台灯具尚缺安装点

阳台：误触 / 不稳定重点区

用户确认问题；根因尚未查明

S04 梁上 + S13 墙面：同一个客厅阳台

洗衣机、晾晒衣物等仅记环境线索

不据照片断定干扰原因，不修改硬件参数

坐标、实体与来源见 home-layout.json

尺寸原图 / 定位依据

保留用户原始尺寸标注；不把示意重绘作为施工或测距依据。

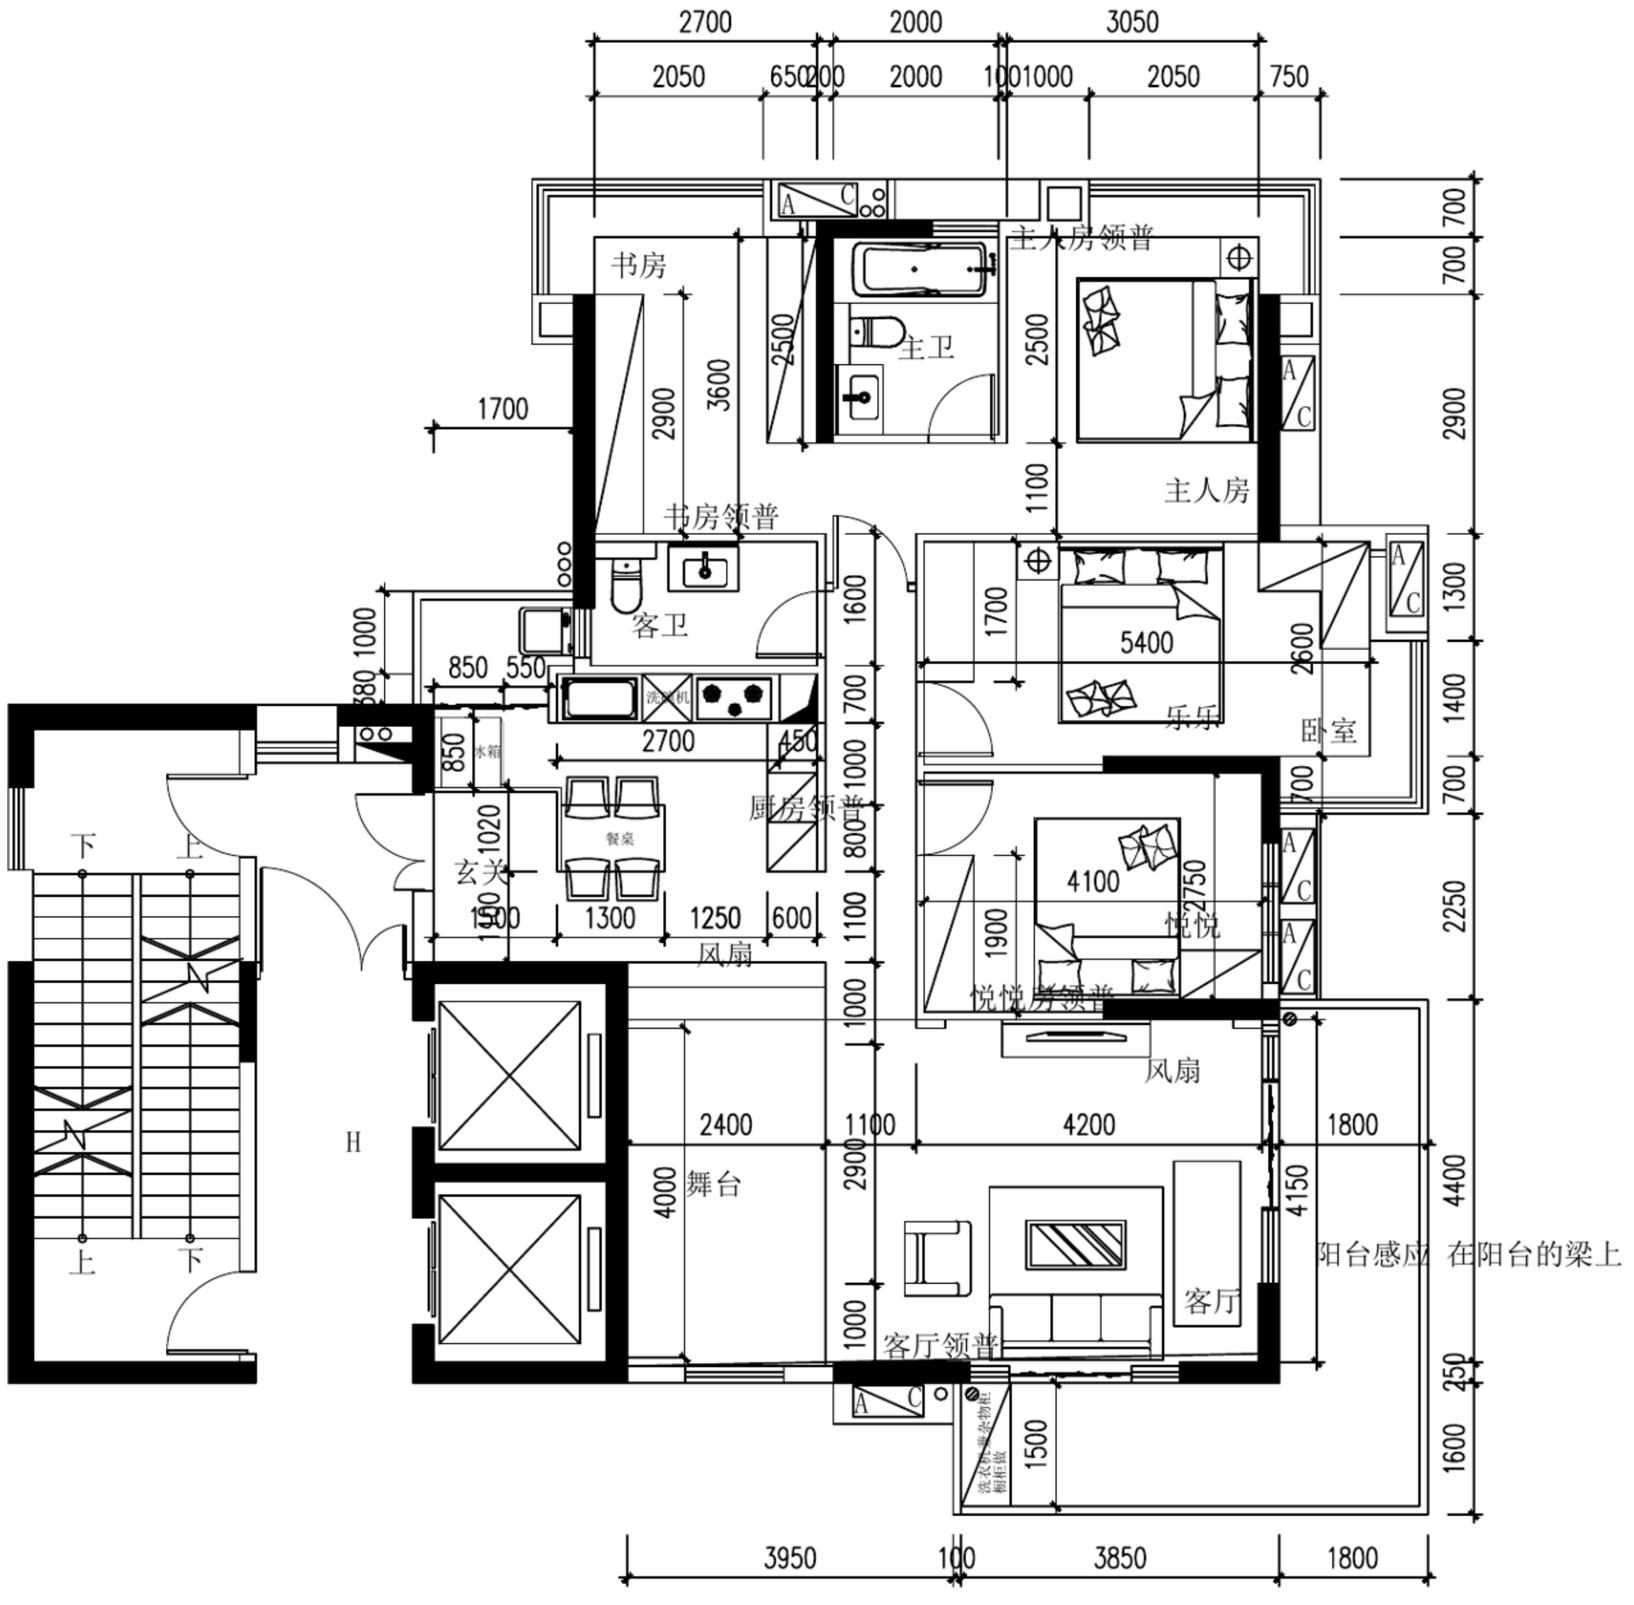

实景校正记录 / v0.5

撤销无法由照片确认的平面坐标，保留照片相对位置；阳台问题按用户反馈登记。

实景-08 阳台墙面感应 S13：洗衣机旁；与梁上为两颗独立设备

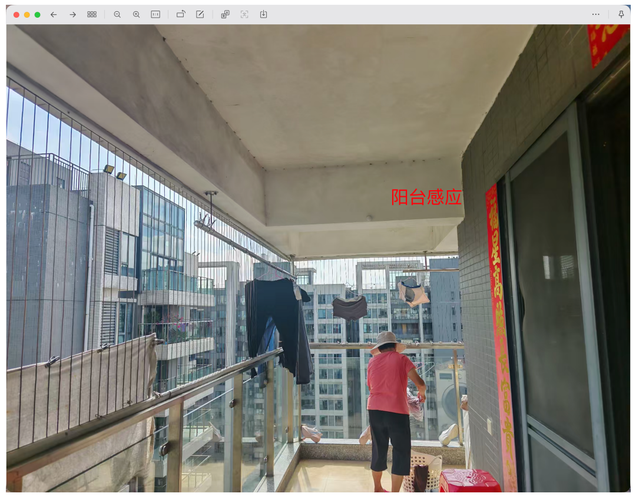

实景-09 阳台梁上感应S04：出阳台横梁立面；红框已确认

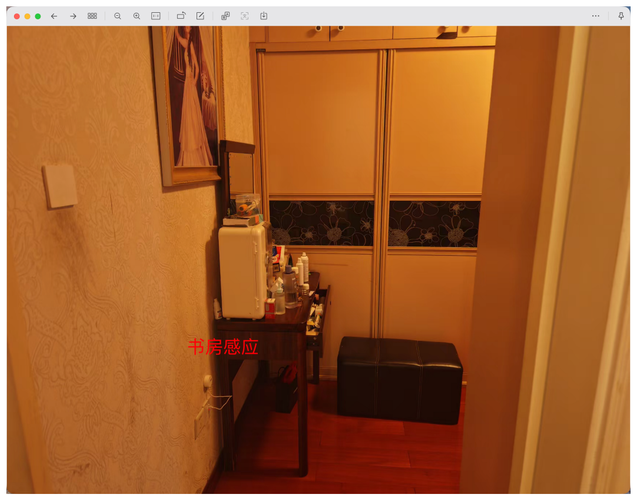

实景-10 书房感应S05：梳妆台侧墙，离地30cm（用户确认）

实景-11 主人房感应S06：空调下方墙、床尾通道侧，离地30cm（用户确认）

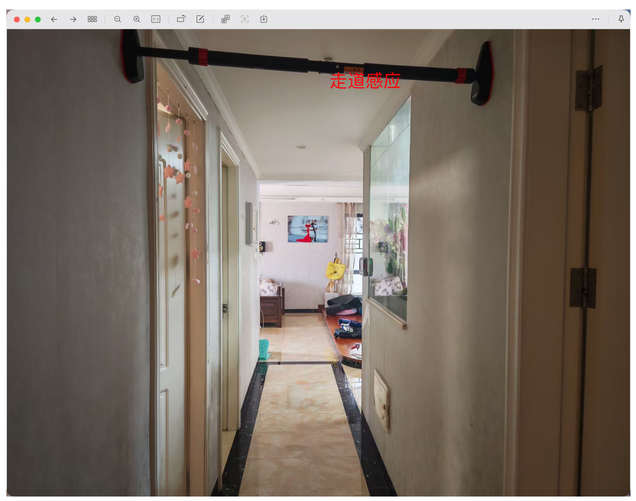

实景-12 走道感应：单杠上方顶面，不在单杠上

阳台问题：用户报告误触频繁、运行不稳定。

仅记录环境，不以照片推断故障根因。

安装高度、方向、实体绑定仍待核对。
